Руководитель
регионального проекта —
Газалапов Ахмед Адамович

_____
(подпись)

09.04.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5A13E251DA750CFEFA274661C2A8D967930ACBE8
Владелец: Газалапов Ахмед Адамович

Действителен: с 25.12.2019 по 25.03.2021

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(F1-96) Жилье Чеченской Республики"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Наличие критических отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Наличие критических отклонений*	*Отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской Республики (годовой объем ввода жилья)	Миллион квадратных метров	0.1525	0.0206	0.0206	0.0206	0.1187	0.1187	17,35%	Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства планируется в IV квартале текущего года.
2		Увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года	Миллион квадратных метров	0.63	0.0651	0.18	0.3	0.715	1.323	4,92%	Существует риск: Установлен завышенный показатель ввода жилья для региона, Причина риска: За базовое значение показателя ввода жилья для Чеченской Республики в рамках федерального проекта принято значение показателя 2017 года. Данный показатель сложился не за счет построенного объема жилья, а вследствие массовой государственной регистрации существующего индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%, Сутевые: Показатель ввода жилья по Чеченской Республике по итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году обеспечена положительная динамика показателя объема ввода жилья, который составил 637,3 тыс. кв. м. При отсутствии

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											дополнительного соглашения о реализации регионального проекта с корректировкой значений показателя ввода жилья, учитывающей реальный объем ввода жилья в регионе, существует риск недостижения показателя установленного перед регионом Предлагаемые решения: 1. Письмом Минстроя России от 21.02.2019 г. №6137-ВЯ/07 до региона доведена корректировка «траектории» достижения значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. в год», согласно которой значение на 2020 г. должно составить - 700 тыс. кв. м. Данная корректировка была согласована Чеченской Республикой (письмо от 25.02.2019 г. № 810/13), но до настоящего времени не нашла свое отражение в паспорте федерального проекта. В целях предупреждения рисков недостижения показателя, считаем необходимым внести изменения в паспорт федерального проекта, в части уточнения для региона прогноза планируемых значений показателя в соответствии с вышеуказанным письмом Минстроя России, срок исполнения 31.12.2020. Установлен завышенный показатель ввода жилья для региона. Прогнозируемые отклонения значения показателя ввода жилья влияют также на значение результата "Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики". На другие параметры и показатели проекта данные отклонения не влияют. В первом квартале указано значение по

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											вводу жилья за февраль месяц текущего года. В связи с распространением новой короновирусной инфекции сроки формирования отчетности Чеченстата передвинуты на более позднюю дату. По сведениям Чеченстата информация по вводу жилья в регионе за март месяц будет доступна 13 апреля текущего года. В отчетности за второй квартал значение будет уточнено.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 721 054,24 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено | Риски исполениня | Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*(03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»*	721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	В соответствии с прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета планировалось, что освоение средств федерального и регионального бюджета начнется в марте месяце (239,7 млн. рублей), однако в связи с возникновением технических проблем при заключении

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									дополнительного соглашения с ФОИВ денежные средства в марте месяце не были доведены. Освоение средств планируется в апреле месяце.
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	В соответствии с прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета планировалось, что освоение средств федерального и регионального бюджета начнется в марте месяце (239,7 млн. рублей), однако в связи с возникновением технических

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									проблем при заключении дополнительного соглашения с ФОИВ денежные средства в марте месяце не были доведены. Освоение средств планируется в апреле месяце.
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			721 054,24	721 054,24	721 054,24	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики	
2		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»	**5**

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			*Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» Значение: 6, на дату 20.01.2020*	20.01.2020	20.01.2020	Газалапов А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Чеченской Республике" Исходящее письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 27.12.2019г. №5690/14, приложен файл. Предоставлена информация : 6 из 6. Информация по результату: Риски не достижения показателя по вводу жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства отсутствуют.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1	КРП		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	20.01.2020	18.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости " Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике от 28.11.2019г. №20:17:0439001:804, приложен файл. 2. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике от 28.11.2019г. № 20:06:2002000:3085, приложен файл. 3. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике от 12.12.2019г. №20:17:0439001:809, приложен файл. 4. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике от 18.12.2019г. № 20:17:0440010:1213, приложен файл. 5. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Выписка из ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чеченской Республике от 31.10.2019г. №20:06:2002000:3060, приложен файл.

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Закрепление права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) по ул. Сайханова , в г. Грозном	20.01.2020	09.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) по ул. Сайханова , в г. Грозном " Исходящее письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 09.12.2019г. № 5293/05, приложен файл.
1.1.2	РРП		Закрепление права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на детский сад (80 мест) по ул. Сайханова в г. Грозном	20.01.2020	18.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на детский сад (80 мест) по ул. Сайханова в г. Грозном " Исходящее письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 18.12.2019г. № 5495/05, приложен файл.
1.1.3	РРП		Закрепление права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на общеобразовательную школу № 28 (220 мест) г. Грозного	20.01.2020	18.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на общеобразовательную школу № 28 (220 мест) г. Грозного" Исходящее письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 18.12.2019г. №5502/05, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.4	РРП		Закрепление права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г. Курчалой	20.01.2020	09.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (360 мест) г. Курчалой " Исходящее письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5289/05, приложен файл.
1.1.5	РРП		Закрепление права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест) г. Курчалой	20.01.2020	09.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении права оперативного управления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на СОШ (720 мест) г. Курчалой " Исходящее письмо Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 09.12.2019г. №5296/05, приложен файл.
1.2	КРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.01.2020	20.01.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-101/06, приложен файл.
1.2.1	РРП		Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчета о расходах Чеченской Республики по заключенному Соглашению в рамках регионального проекта "Жилье Чеченской Республики" за IV квартал 2019 г.	20.01.2020	20.01.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 20.01.2020г. №069-09-2019-101/06, приложен файл.

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			*Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике» Значение: 4, на дату 20.01.2021*	20.01.2021	20.01.2021	Газалапов А. А.	Информация по значению результата: В работе.Риски не достижения показателя по вводу жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства отсутствуют. Предоставлена информация : 4 из 4. Информация по результату: Риски не достижения показателя по вводу жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства отсутствуют.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	КРП		Земельный участок предоставлен заказчику	10.04.2020	12.02.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Надтеречного муниципального района" Прочий тип документа Администрации Надтеречного муниципального района от 12.02.2020г. №1, приложен файл. 2. "О закреплении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования" Распоряжение Администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики от 28.05.2019г. №729-р, приложен файл. 3. "О предварительном согласовании предоставления земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 30.09.2019г. №302, приложен файл. 4. "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование" Распоряжение Администрации Шатойского муниципального района Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен файл. 5. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 06.11.2019г. №368, приложен файл. 6. "О предварительном согласовании предоставления земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл. 7. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для строительства детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики	01.03.2020	28.05.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О закреплении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования" Распоряжение Администрации Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики от 28.05.2019г. №729-р, приложен файл.
2.1.2	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для строительства детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.03.2020	30.09.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предварительном согласовании предоставления земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 30.09.2019г. №302, приложен файл.
2.1.3	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для строительства детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского муниципального района Чеченской Республики	01.03.2020	12.07.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование" Распоряжение Администрации Шатойского муниципального района Чеченской Республики от 12.07.2019г. №110, приложен файл.
2.1.4	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для строительства детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.03.2020	06.11.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 06.11.2019г. №368, приложен файл.
2.1.5	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для проведения работ по строительству сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	10.04.2020	12.02.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Надтеречного муниципального района" Прочий тип документа Администрации Надтеречного муниципального района от 12.02.2020г. №1, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.6	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для проведения работ по строительству подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.03.2020	11.10.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предварительном согласовании предоставления земельного участка" Распоряжение Администрации Надтеречного муниципального района Чеченской Республики от 11.10.2019г. №335, приложен файл.
2.1.7	РРП		Получение разрешения на использование земель или земельного участка для строительства учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г. Грозный	01.03.2020	19.11.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении земельного участка" Распоряжение Мэрии города Грозного от 19.11.2019г. №1827, приложен файл.
2.2	КРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.04.2020	03.03.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. № 20 RU-20507307-010-2020, приложен файл. 2. "Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл. 3. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова" Разрешение на строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г. №20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл. 4. "Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района Чеченской Республики" Разрешение на строительство Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское,

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Чеченской Республики от 03.03.2020г. №20 RU-20507307 -008-2019, приложен файл. 5. "Строительство детского сада на 140 мест г. Курчалой, Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики от 02.12.2019г. №20-506000-51-2019, приложен файл. 6. "Строительство детского сада на 140 мест, в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района Чеченской Республики" Разрешение на строительство 14.01.2020 от 14.01.2020г. №20 RU-20507307-001-2020, приложен файл. 7. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского муниципального района Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Шатойского муниципального района от 10.01.2020г. №20 -RU20514000-01-2020, приложен файл.
2.2.1	РРП		Получение разрешения на строительство детского сада на 140 мест в г. Курчалой Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	02.12.2019	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство детского сада на 140 мест, г. Курчалой, Курчалоевского муниципального района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрации Курчалоевского муниципального района от 02.12.2019г. №20-506000-51-2019, приложен файл.
2.2.2	РРП		Получение разрешения на строительство детского сада на 140 мест в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	14.01.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство детского сада на 140 мест, с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрации Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики от 14.01.2020г. №20 RU-20507307 -001-2020, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.3	РРП		Получение разрешения на строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале Шатойского муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	10.01.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство детского сада на 80 мест в с. Бекум-Кале, Шатойского муниципального района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрации Шатойского муниципального района, Чеченской Республики от 10.01.2020г. №20-RU20514000 -01-2020, приложен файл.
2.2.4	РРП		Получение разрешения на строительство детской поликлиники в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	03.03.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство детской поликлиники в с. Знаменское, Надтеречного района, Чеченской Республики " Разрешение на строительство Администрация Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. № 20 RU-20507307-010-2020, приложен файл.
2.2.5	РРП		Получение разрешения на строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	03.03.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство сетей водоснабжения жилого микрорайона в с. Знаменское, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. № 20 RU-20507307-008-2019, приложен файл.
2.2.6	РРП		Получение разрешения на строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской Республики	01.04.2020	03.03.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство подъездных дорог жилого микрорайона в с. Знаменское, Надтеречного муниципального района, Чеченской Республики" Разрешение на строительство Администрация Надтеречного муниципального района от 03.03.2020г. №20 RU- 20507307-009-2019, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.7	РРП		Получение разрешения на строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия № 1 им. А. Кадырова" в г. Грозный	01.04.2020	17.02.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Строительство учебного корпуса на 600 мест при МБОУ "Гимназия №1 им. А. Кадырова"" Разрешение на строительство Мэрия города Грозного от 17.02.2020г. № 20 RU- 20301000-014-2020, приложен файл.
2.3	КРП		Закупка включена в план закупок	01.05.2020	26.02.2020	Газалапов А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о планируемых закупках размещена на сайте "Единой информационной системы в сфере закупок"" План график закупок Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 26.02.2020г. № 202001942000053001, указана ссылка.
3			*Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики Значение: 1.188, на дату 31.12.2019*	31.12.2019	31.12.2020	Газалапов А. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве введенной в действие общей площади жилых домов в регионе опубликована на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы" Иное Росстат от 31.12.2019г. №-, приложен файл, указана ссылка. Существует риск: Установлен завышенный показатель ввода жилья для региона, Причина риска: За базовое значение показателя ввода жилья для Чеченской Республики в рамках федерального проекта принято значение показателя 2017 года. Данный показатель сложился не за счет построенного объема жилья, а вследствие массовой государственной регистрации существующего индивидуального жилищного фонда, Вероятность: 100%, Сутевые: Показатель ввода жилья по Чеченской Республике по итогам 2018 года составил 600,3 тыс. кв. м. В 2019 году обеспечена положительная динамика показателя объема ввода жилья, который составил 637,3 тыс. кв. м. При отсутствии дополнительного соглашения о реализации

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							регионального проекта с корректировкой значений показателя ввода жилья, учитывающей реальный объем ввода жилья в регионе, существует риск недостижения показателя установленного перед регионом. Предлагаемые решения: 1. Письмом Минстроя России от 21.02.2019 г. №6137-ВЯ/07 до региона доведена корректировка «траектории» достижения значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. в год», согласно которой значение на 2019 г. должно составить - 614 тыс. кв. м. Данный показатель достигнут в полном объеме (104 %). Данная корректировка была согласована Чеченской Республикой (письмо от 25.02.2019 г. № 810/13), но до настоящего времени не нашла свое отражение в паспорте федерального проекта. В целях предупреждения рисков недостижения показателя в дальнейшем, считаем необходимым внести изменения в паспорт федерального проекта, в части уточнения для региона прогноза планируемых значений показателя в соответствии с вышеуказанным письмом Минстроя России., срок исполнения 31.12.2020. В качестве подтверждающего документа использована выгрузка с сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 0.6373 из 1.188.

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

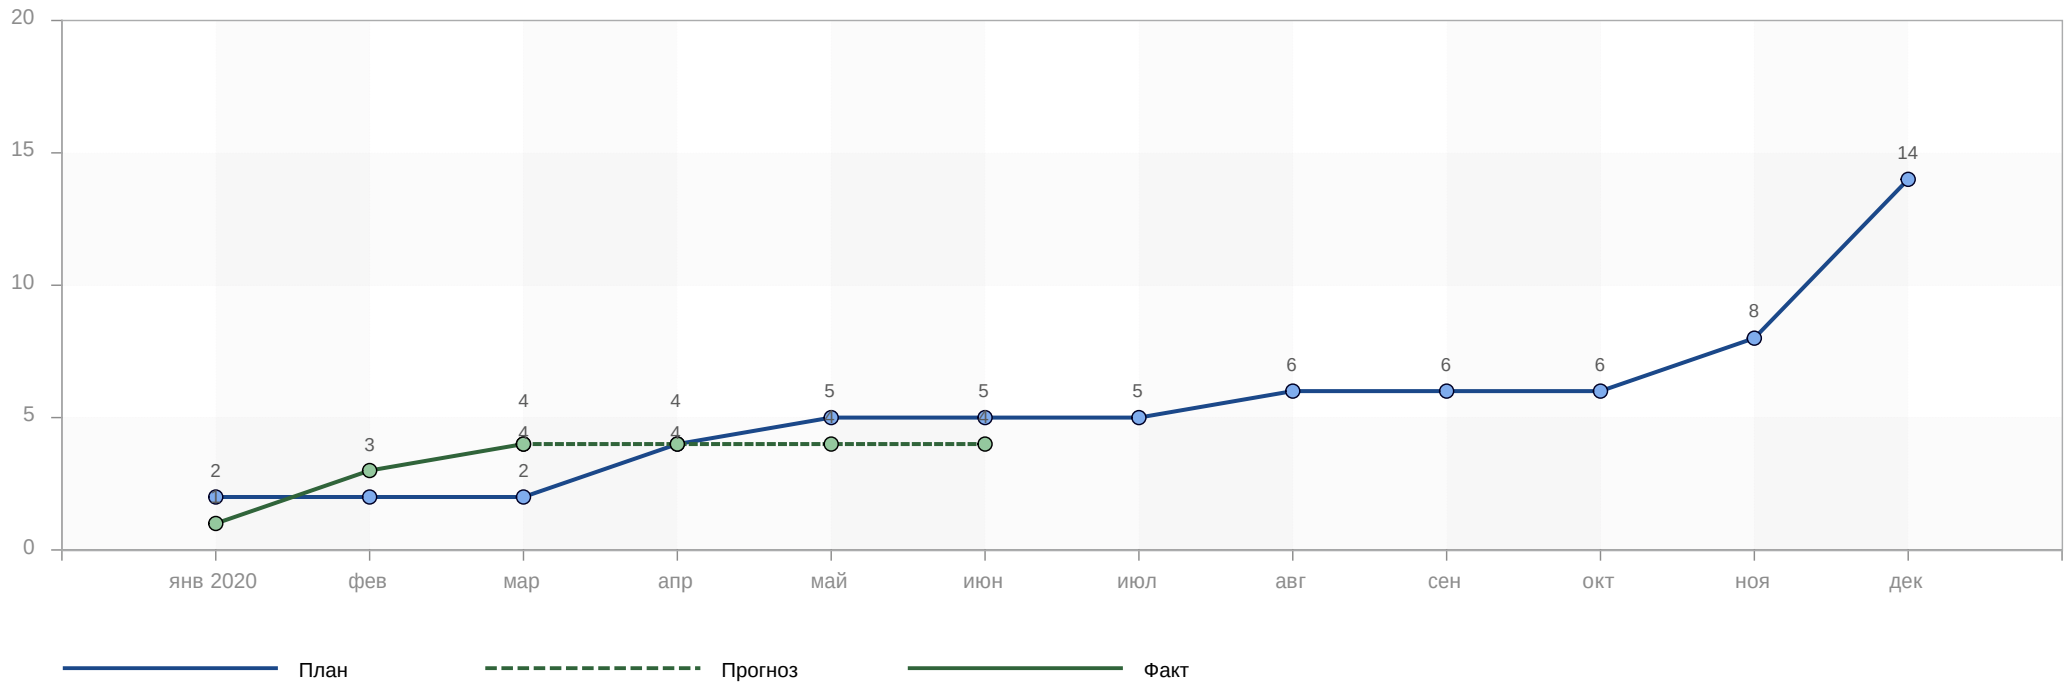

Рис. 1. *"(F1-96) Жилье Чеченской Республики"*

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

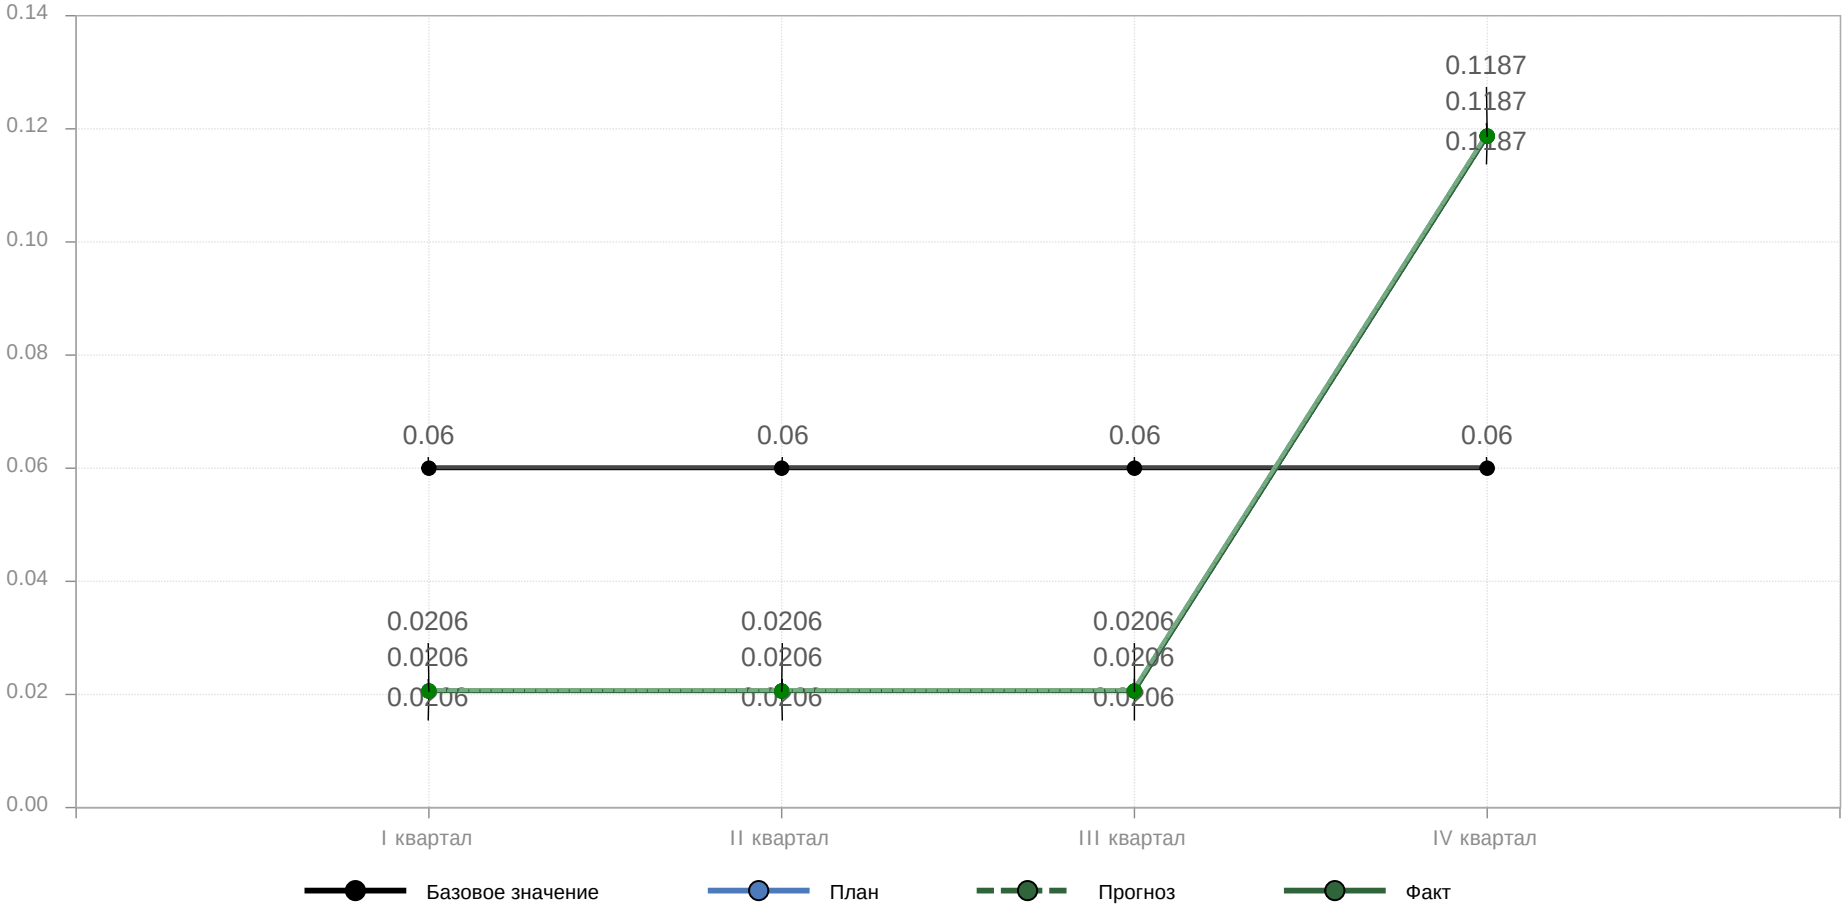

Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской Республики (годовой объем ввода жилья)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

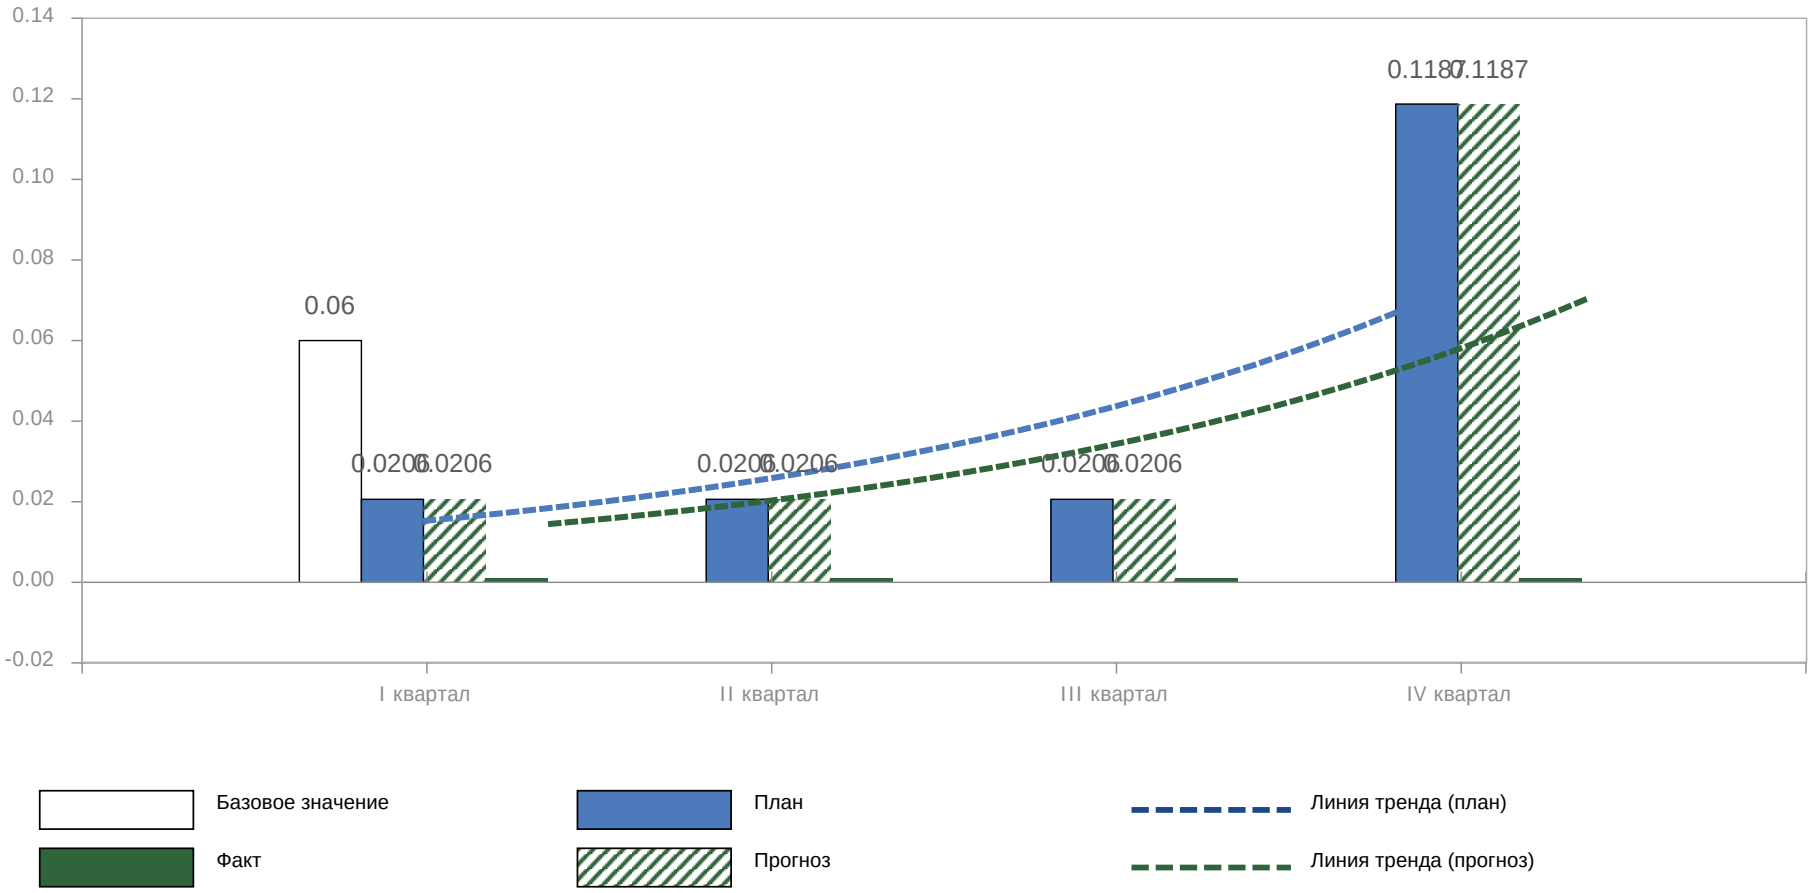

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской Республики (годовой объем ввода жилья)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

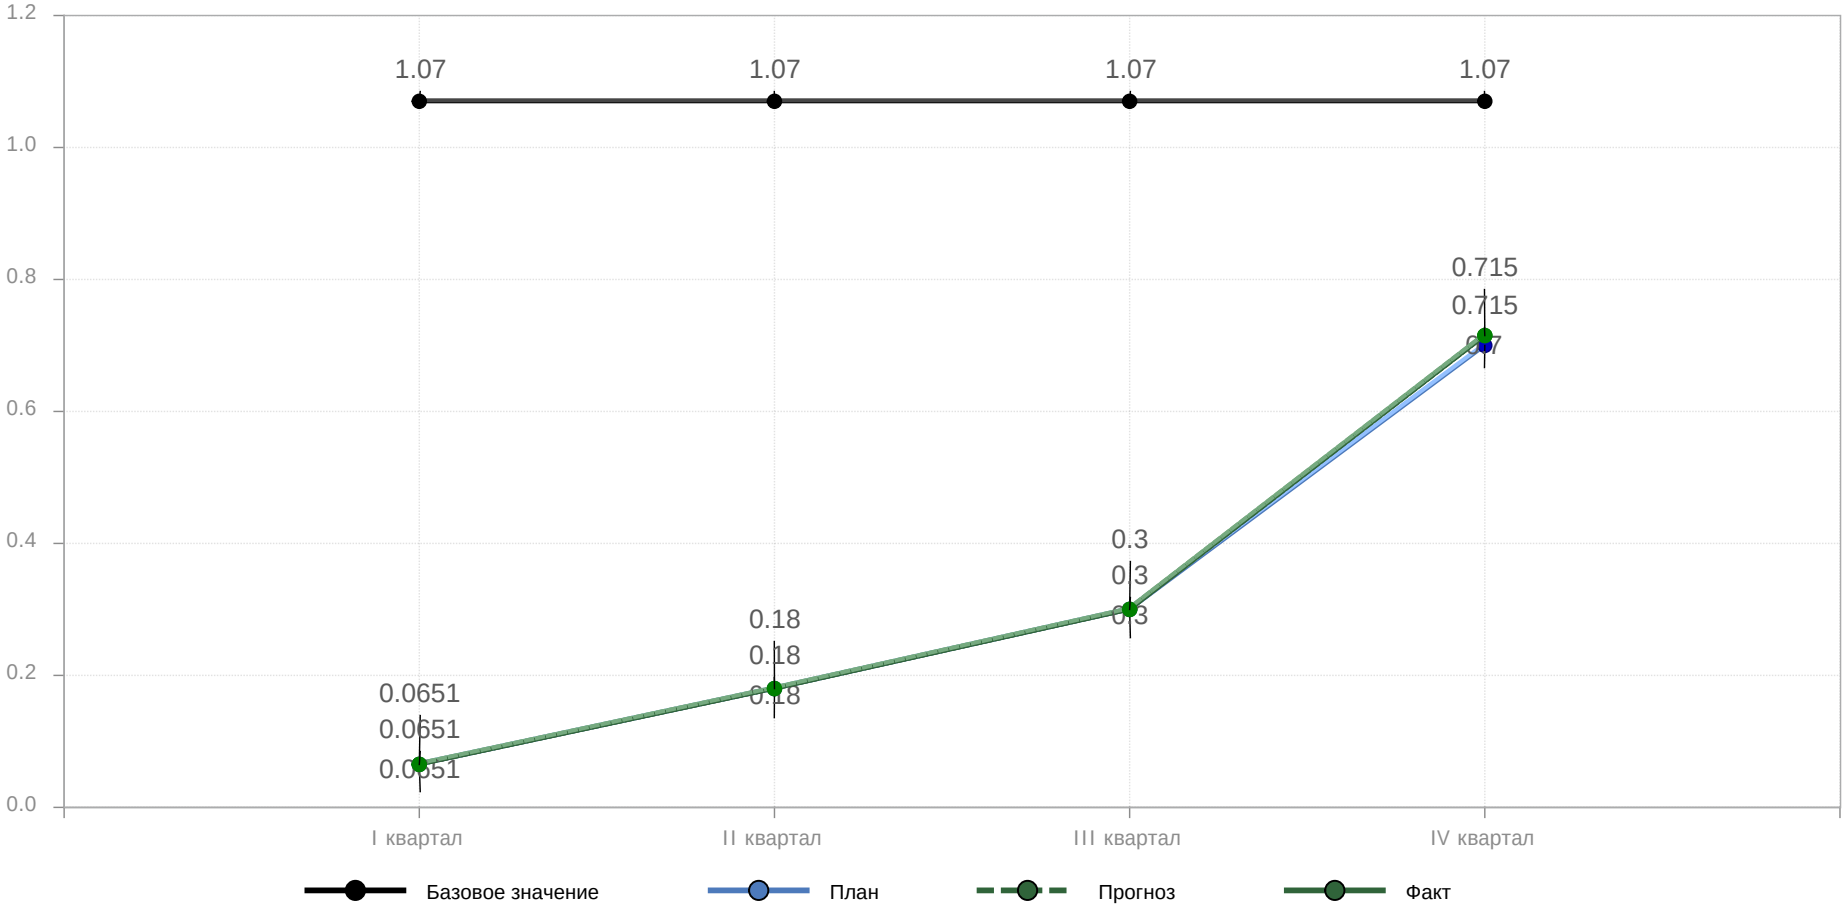

Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

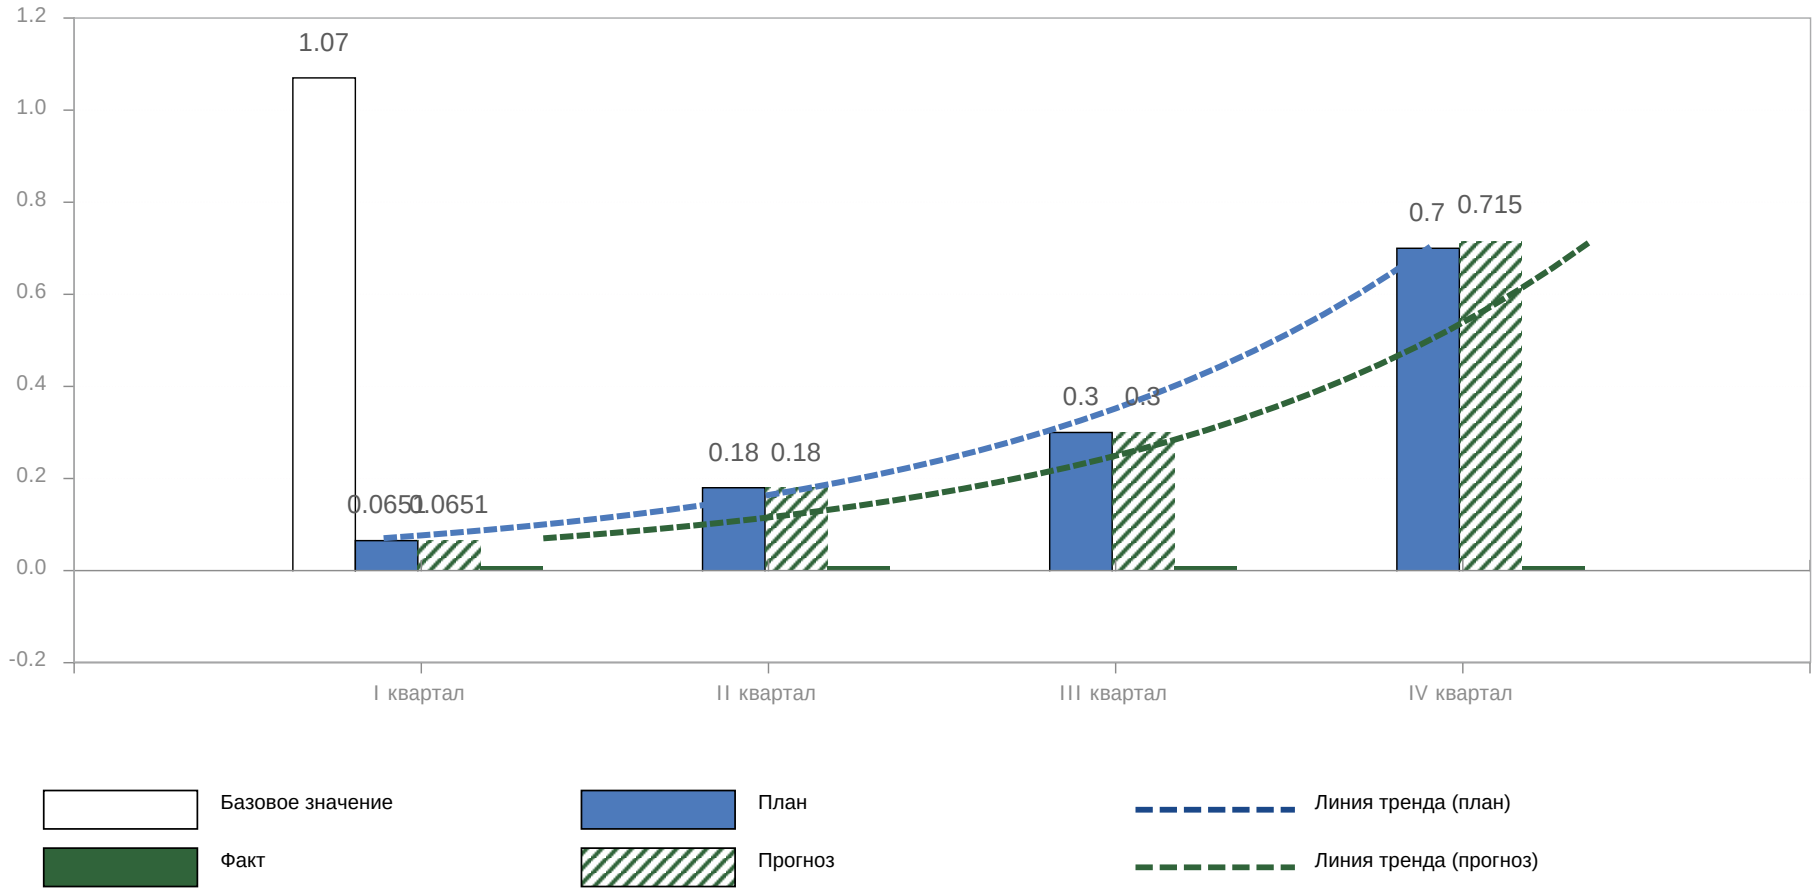

Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства на территории Чеченской Республики до 1 620 тыс. м2 в год к концу 2024 года
