Руководитель
регионального проекта —
Адаев Рамзан Сайд-Хасанович

_____
(подпись)

09.04.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
59C189A40BD3D2939EB84ED4FFEEB7CB3E16F027
Владелец: Адаев Рамзан Саид-Хасанович

Действителен: с 25.03.2020 по 25.06.2021

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		--		
Отсутствие отклонений	*Наличие критических отклонений*	--	--	--

В отчетном и плановом периоде отсутствуют достигаемые КТ и результаты

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Процент	0	0	0	0	0	27	0,00%	Существует риск: Отсутсвие государственной поддержки на создание мощностей по обработке ТКО, Причина риска: Для достижения целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработана проектная документация на строительство новых 8-ми экологичных мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 667 218,3 тыс.руб. Для строительства и запуска указанных мощностей, как важнейшей составной части современной схемы обращения с ТКО на территории Чеченской Республики требуется государственная поддержка. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на отчетный период не доведено ФОИВ., Вероятность: 100%, Сутевые: Привлечение частного бизнеса в реализацию регионального проекта на данном этапе повлечет за собой закономерное повышение тарифов на вывоз ТКО вследствие включения в него

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											инвестиционной составляющей на строительство новых мощностей, что послужит поводом для социальной напряженности среди жителей дотационного региона, подавляющую часть населения которого составляют многодетные семьи со средним доходом. Риск недостижения целей и задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Предлагаемые решения: 1. Предоставление Чеченской Республике в 2020 году субсидии из федерального бюджета в объеме 660,546 млн.руб., с условием обеспечения софинансирования из республиканского бюджета, на реализацию мероприятий по строительству объектов обоаботки ТКО., срок исполнения 31.12.2020.
2		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0	60	60	60	50	50	83,33%	При наличии финансирования мероприятий РП из федерального бюджета риск недостижения показателя отсутствует. На отчетную дату оборудование в рамках РП не приобреталось
4		Доля разработанных электронных моделей территориальных схем	Процент	1	1	1	1	1	1	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чеченской Республике									Чеченской Республике" Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики от 19.12.2019г. №733, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

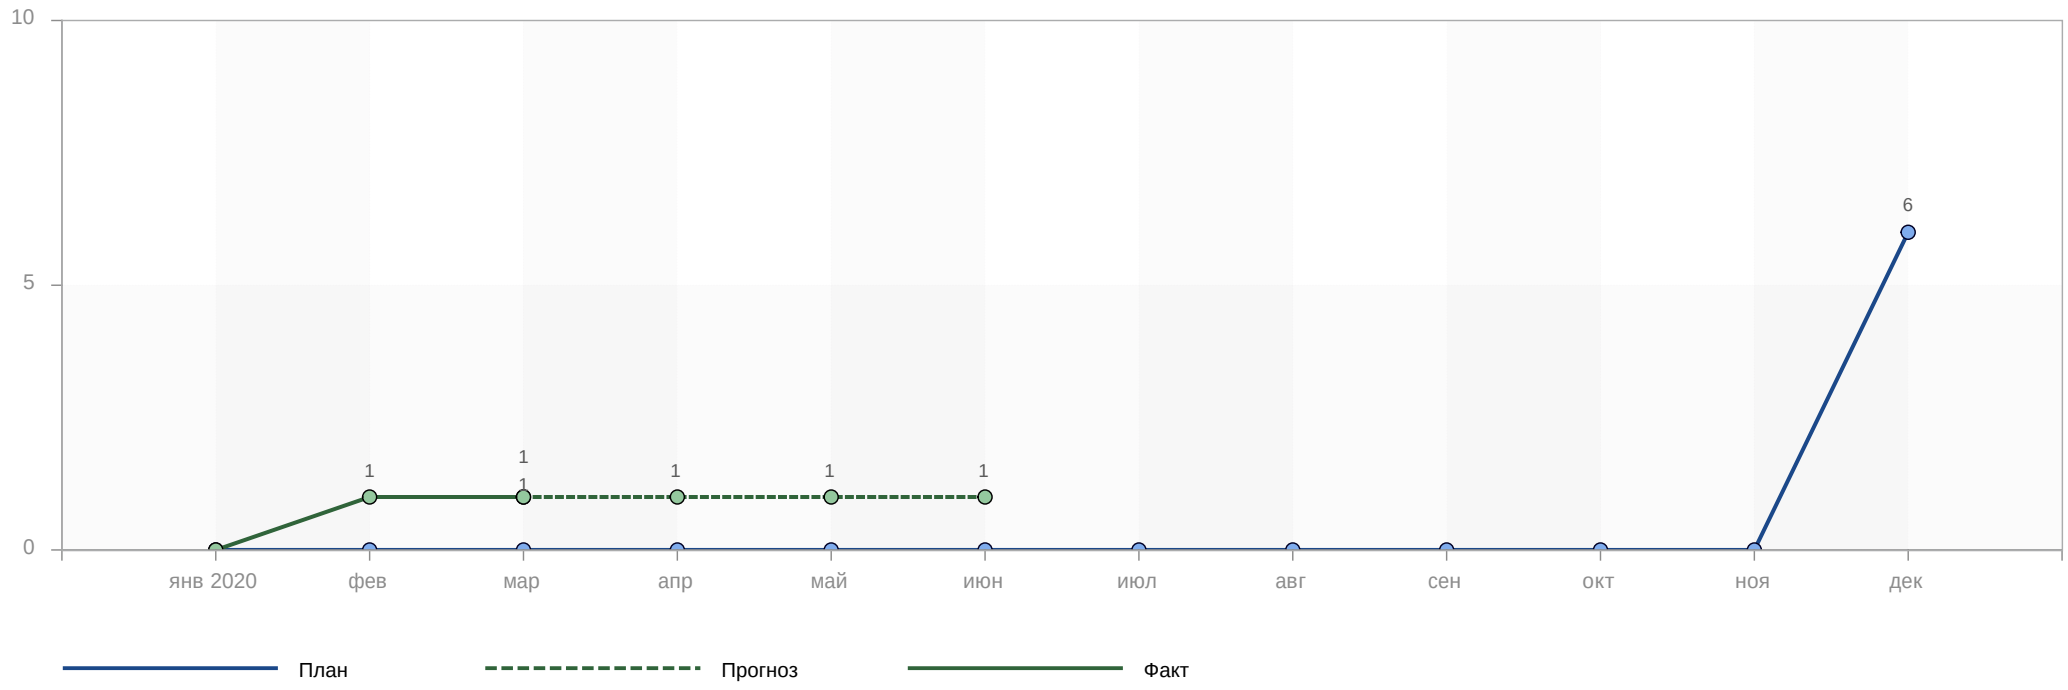

Рис. 1. *"(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"*

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

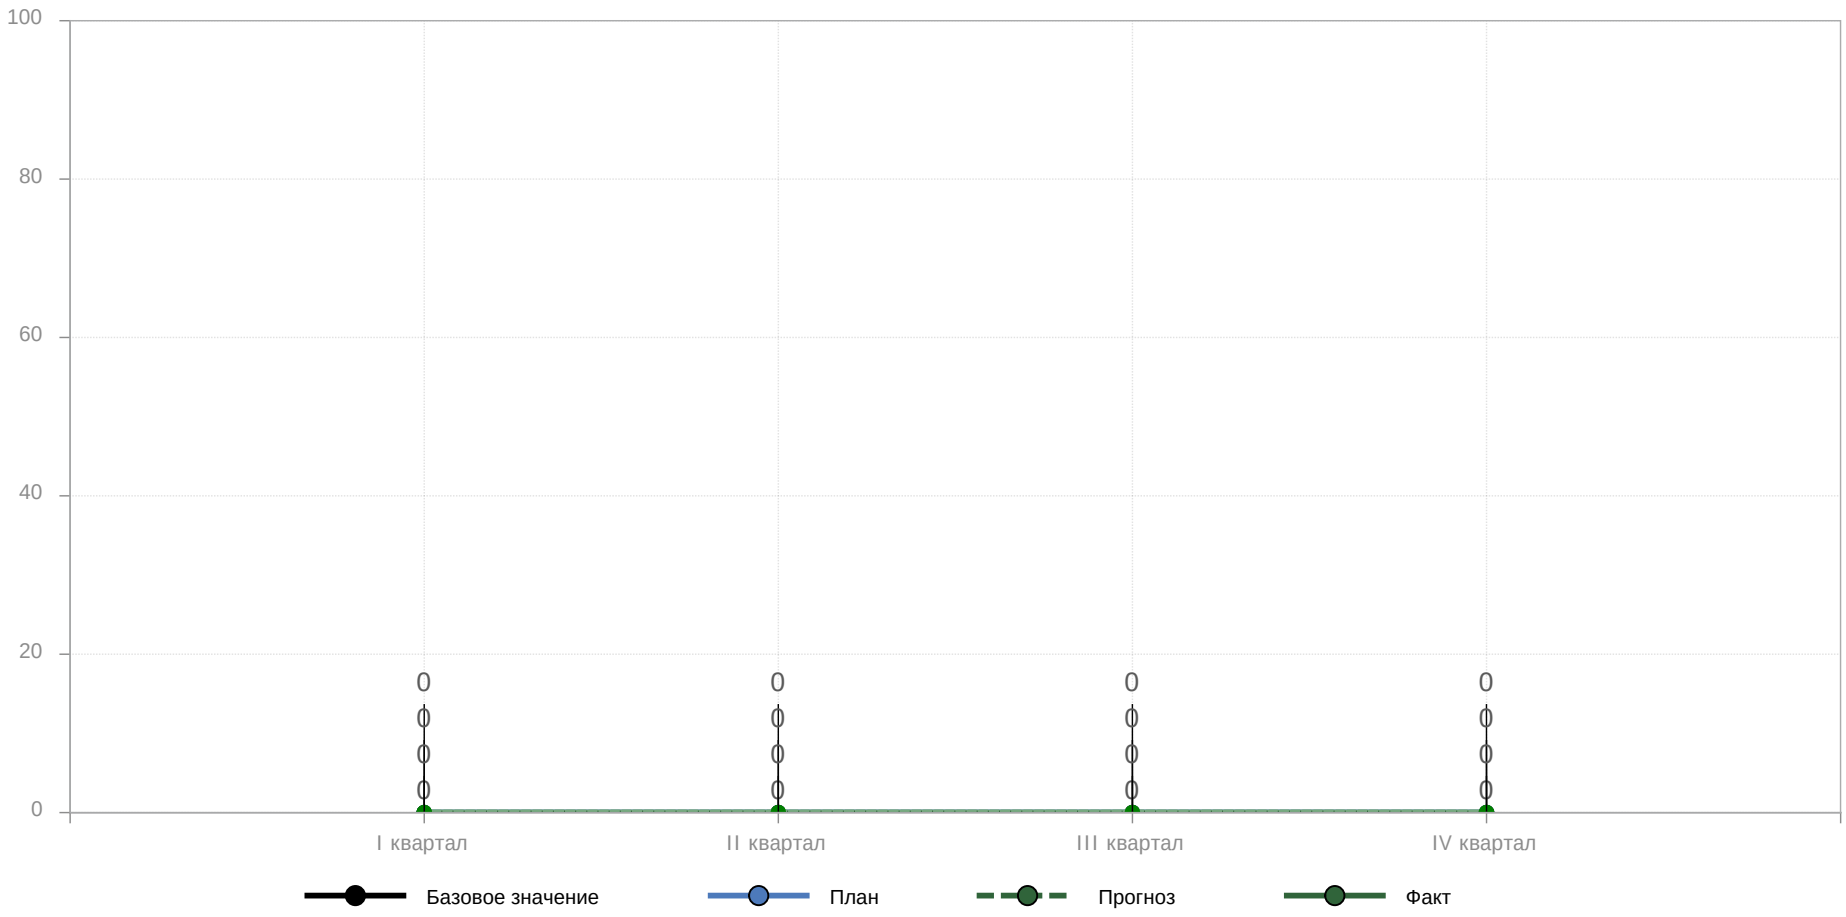

Рис. 1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

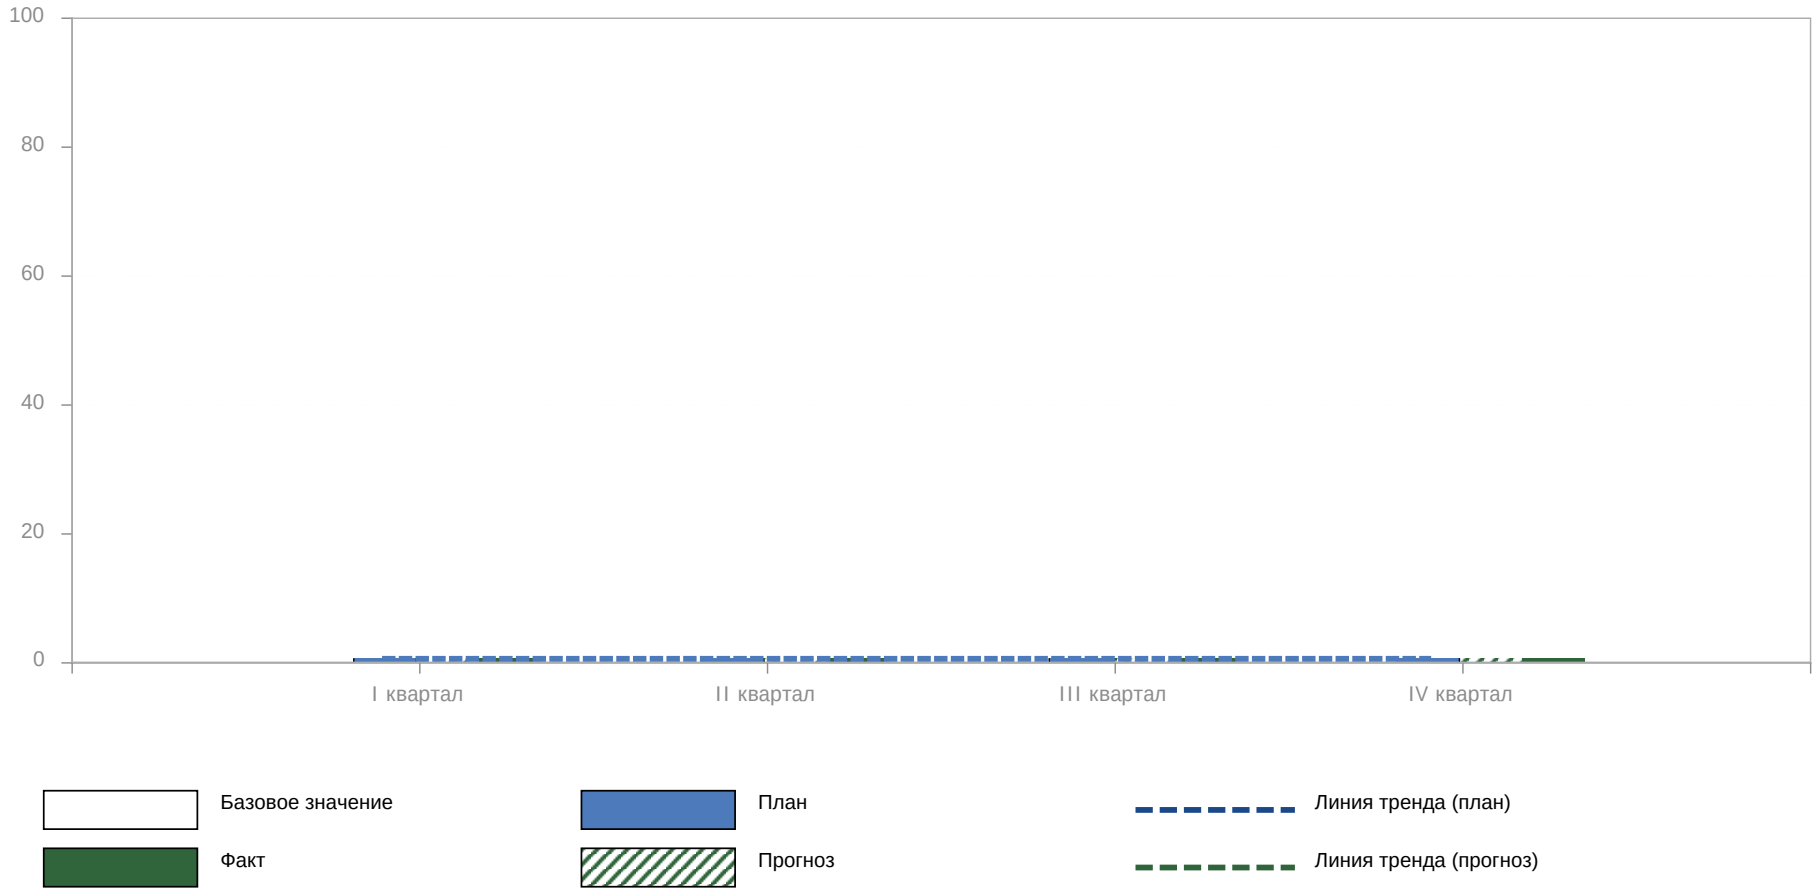

Рис. 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

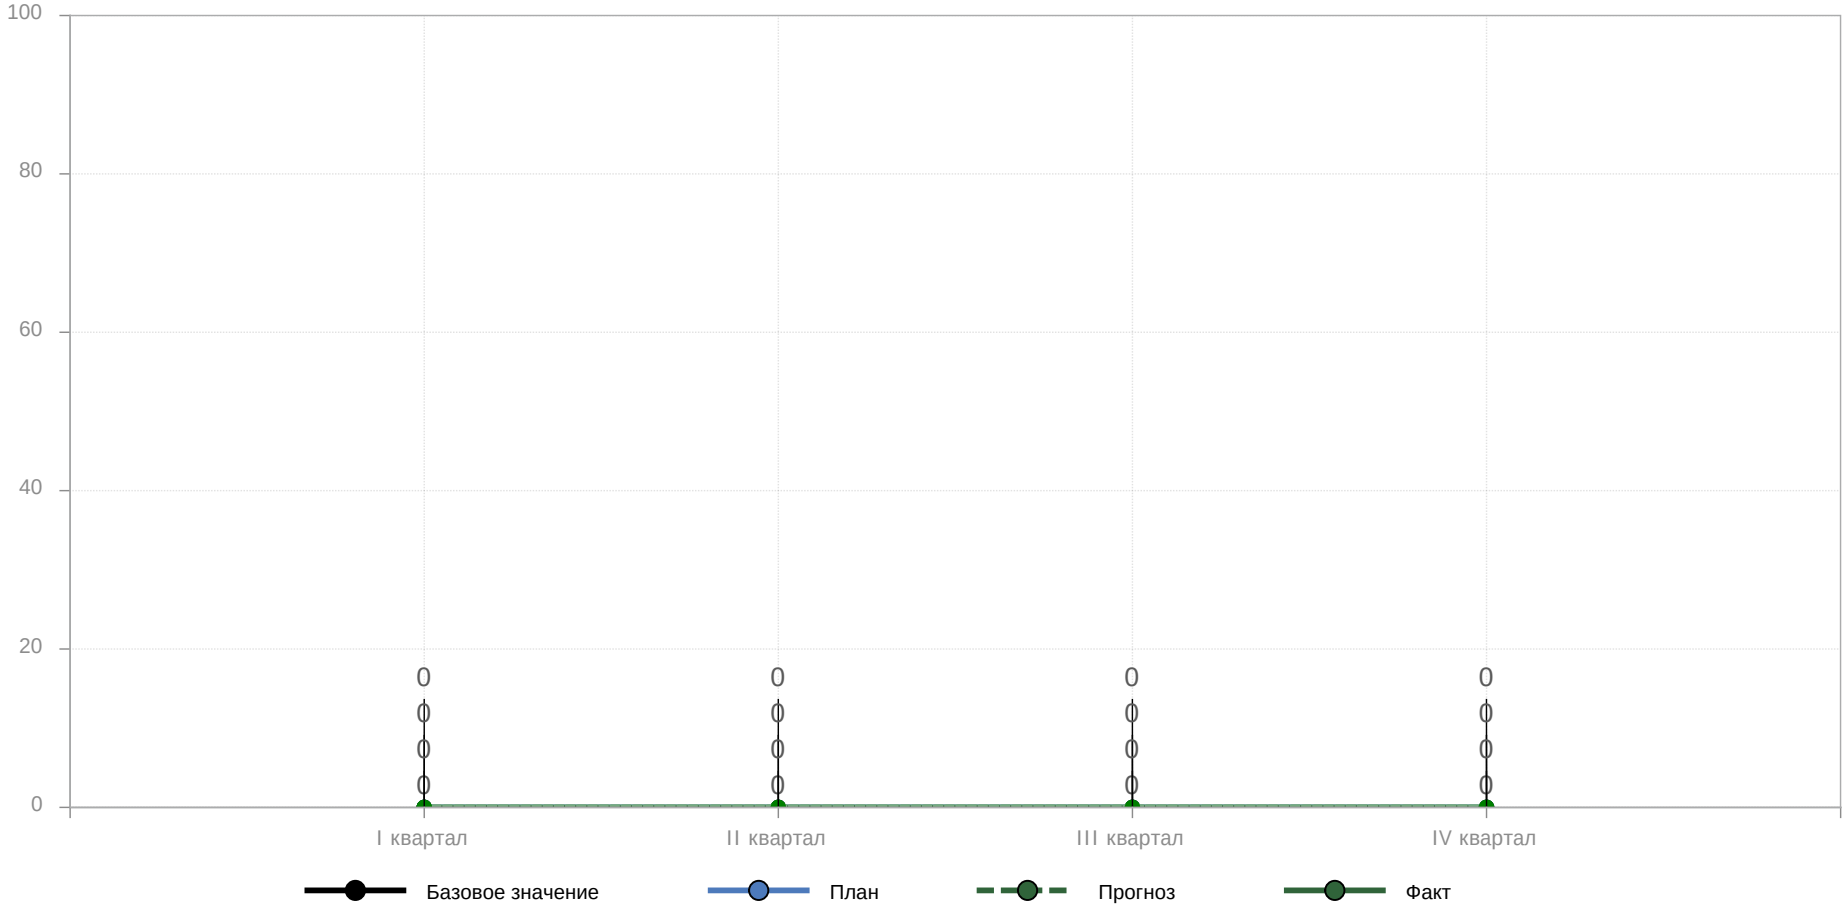

Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

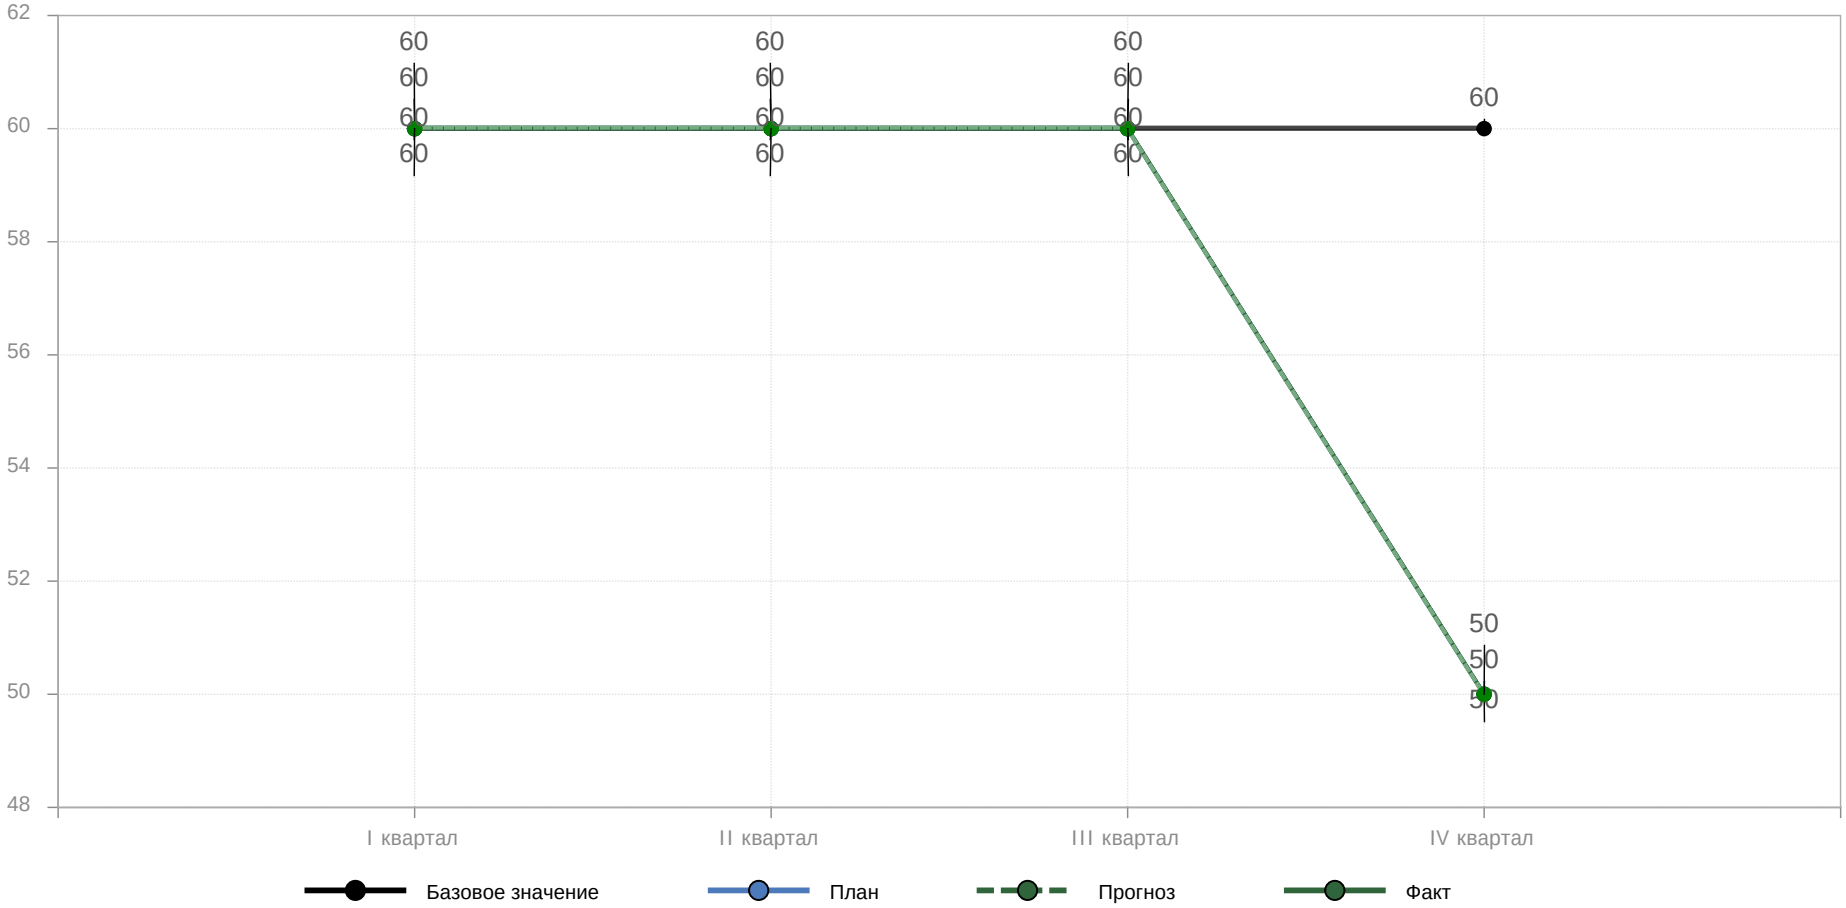

Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

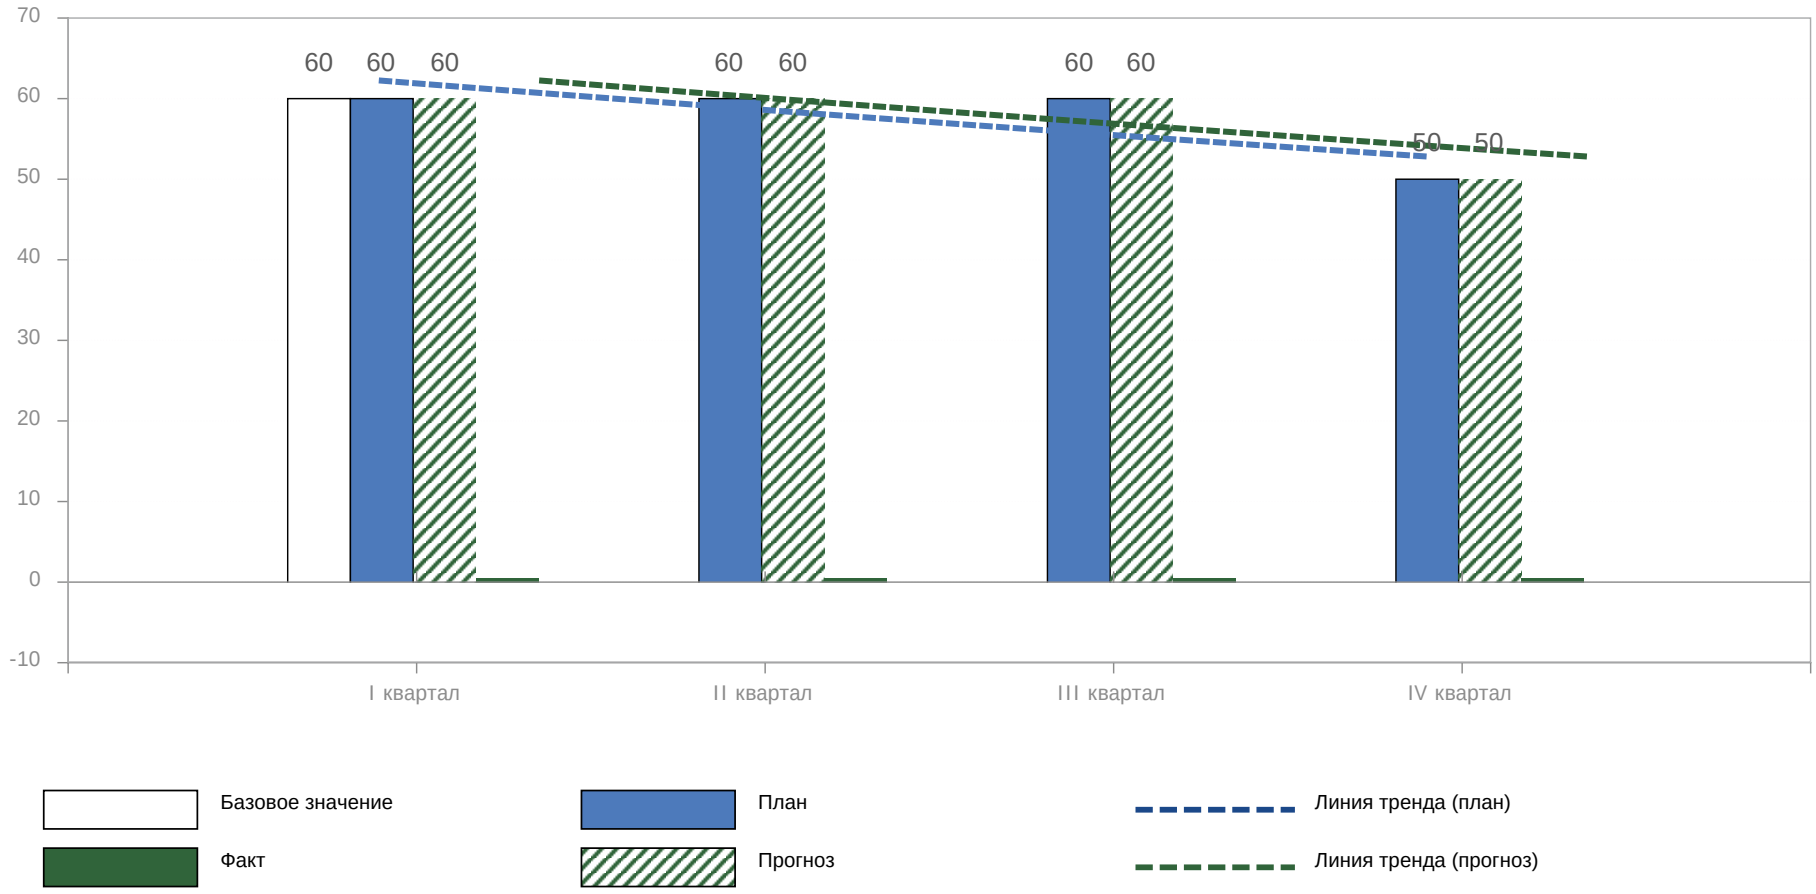

Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

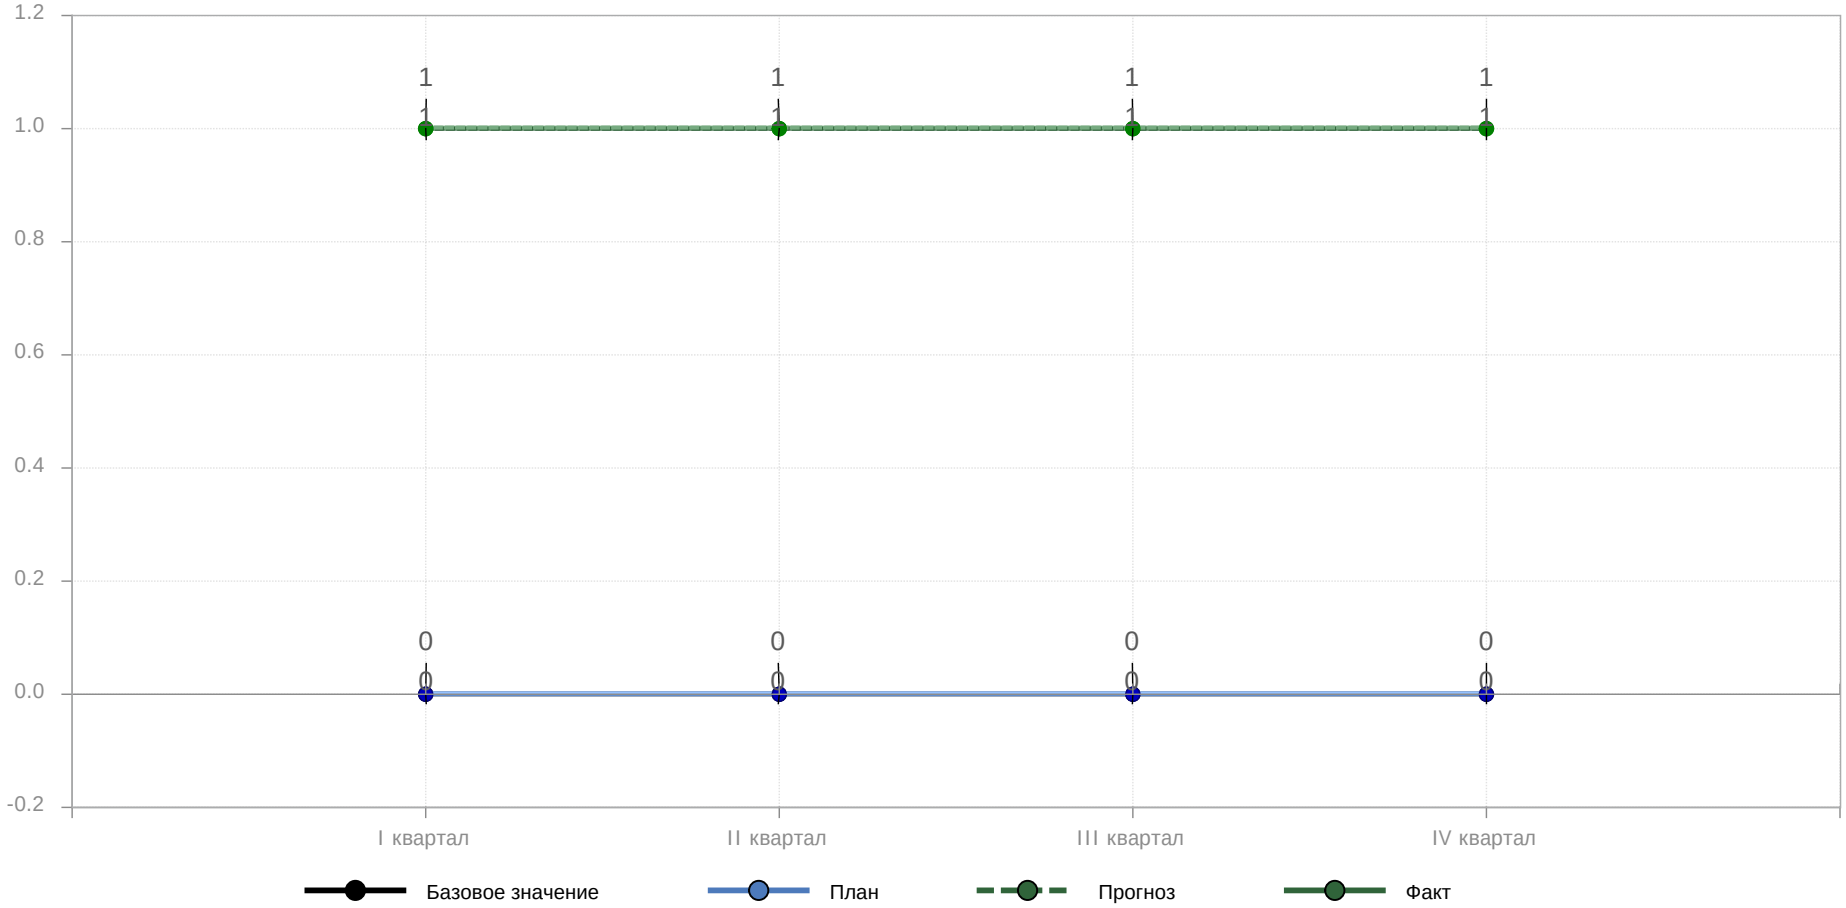

Рис. 7. Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чеченской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

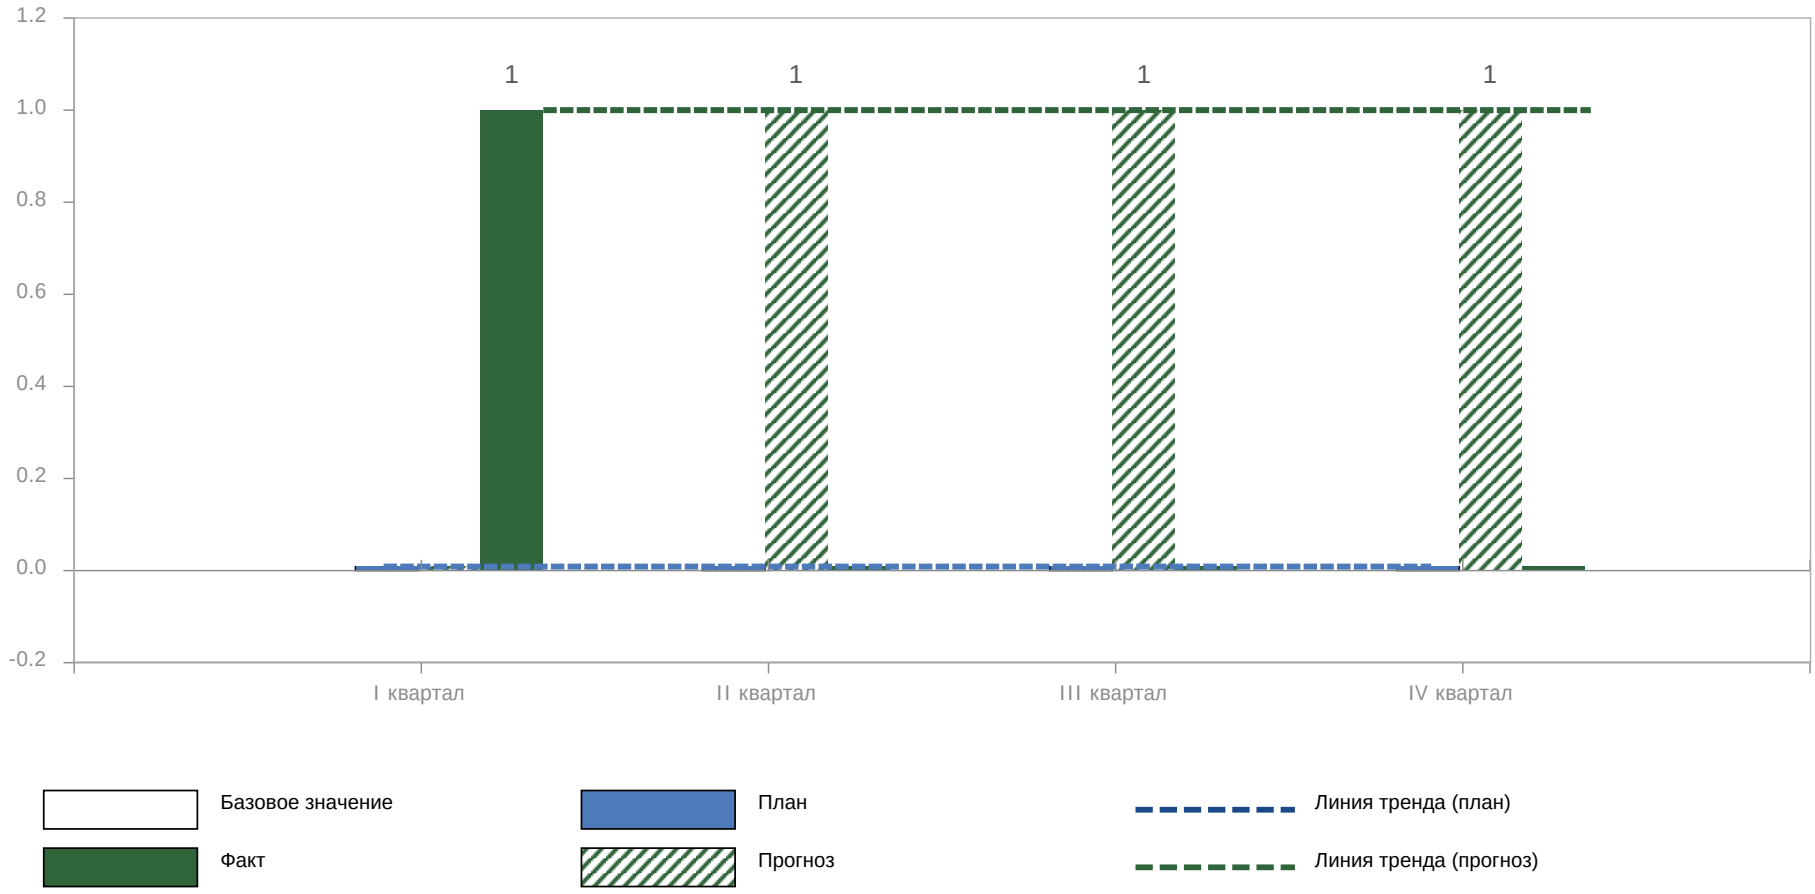

Рис. 8. Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чеченской Республике
